

Представитель Подрядчика

Начальник ОП г. Краснодар

ООО «Сфера-95»

Рогожников А.Ю.

«__» _____ 2025г



«УТВЕРЖДАЮ»

Ведущий инженер Филиала ПАО «МТС»

в Краснодарском крае

Александрин А.В.

«__» _____ 2025г

АКТ

обследования площадки клиента ФБЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53 для Организация системы охранного видеонаблюдения

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель ПАО «МТС» (Заказчик): Александрин А.В.
- представитель ООО «Сфера-95» (Подрядчик): Рогожников А.Ю.

составили настоящий акт о том, что в 2025 г. были проведены работы по обследованию площадки клиента: ФБЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53, с целью организации системы охранного видеонаблюдения.

1. Обследование проводилось на основании следующих исходных данных:

1.1 Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ для клиента ФБЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» по адресу: г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53.

2. В результате обследования было выявлено:

2.1 Монтаж охранного видеонаблюдения периметра на данном объекте – возможен.

3. Технические решения

3.1 ВЕРХНЯЯ ЗОНА

Требуется организовать систему охранного видеонаблюдения за периметром и на КПП. Для этого необходим монтаж уличных цилиндрических видеокамер.

Для организации связи и питания видеокамер необходимо смонтировать шкафы в удобном для этого месте. 3 шкафа внутренних и 2 шкафа уличных IP 66. В шкафы установить PoE-коммутаторы, ИБП и оптический кросс. Связь между шкафами обеспечить посредством прокладки линий ВОЛС. Основной способ прокладки линий ВОЛС – в ПНД трубе по ограждению и в грунте. Питание шкафов взять от ближайших точек 220В. Точки питания должен обозначить собственник.

Ядро сети (Видеорегистратор, коммутатор и ИБП) – установить в проектур. стойке 42U в серверном помещении здания ФОК.

Камеры установить на проектируемых мет. трубостойках высотой 2,5м – 3м, закрепленных к конструкциям ограждения. Способ крепления трубостоек определить на этапе разработки проектной документации. Так же на отдельностоящих опорах высотой 4.5м. Произвести бетонирование основания устанавливаемых опор на глубину 0,5-1м в зависимости от типа грунта.

Переход автомобильных въездов производить подземным способом с шпроблением бетонного основания.

3.2 НИЖНЯЯ ЗОНА

Требуется организовать систему охранного видеонаблюдения за периметром и на КПП. Для этого необходим монтаж уличных цилиндрических видеокамер.

Для организации связи и питания видеокамер необходимо смонтировать шкафы в удобном для этого месте. В шкафы установить РоЕ-коммутаторы, ИБП и оптический кросс. Связь между шкафами обеспечить посредством прокладки линий ВОЛС. Основной способ прокладки линий ВОЛС — в ПНД трубе по ограждению и в грунте. Питание шкафов взять от ближайших точек 220В. Точки питания должен обозначить собственник.

Камеры установить на проектируемых мет. трубостойках высотой 2,5м – 3м, закрепленных к конструкциям ограждения. Способ крепления трубостоек определить на этапе разработки проектной документации. Так же на отдельностоящих опорах высотой 4м. Произвести бетонирование основания устанавливаемых опор на глубину 0,5-1м в зависимости от типа грунта.

Переход автомобильных въездов производить подземным способом с шпурлением бетонного основания.

Связь оборудования с видеорегистратором, расположенным в ФОКе верхней зоны обеспечить путем задействования существующего оптического волокна заказчика.

На объекте предполагается использование существующих оптических линий клиента на участках:

1. Верхняя зона ФОК – Котельная, количество волокон — 1 ОВ.
2. Верхняя зона ФОК — нижняя зона Лодочная станция/Здание 4К — 1 ОВ.


3.3 Кронирование

1. Проектом и сметным расчетом не предусмотрено выполнение кронирования деревьев и кустарников, мешающих обзору в/камер.

3.4 Объектив в/камер

1. Для охраны периметра предусмотреть установку в/камер с объективом 3,6мм. Для просмотра внутренней территории и зоны КПП — использовать камеры с объективом 3,6мм.


Схема организации связи системы охранного видеонаблюдения для клиента ФБЛПУ «САНАТОРИЙ
РАДУГА ФНС»к г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53
ВЕРХНЯЯ ТЕРРИТОРИЯ

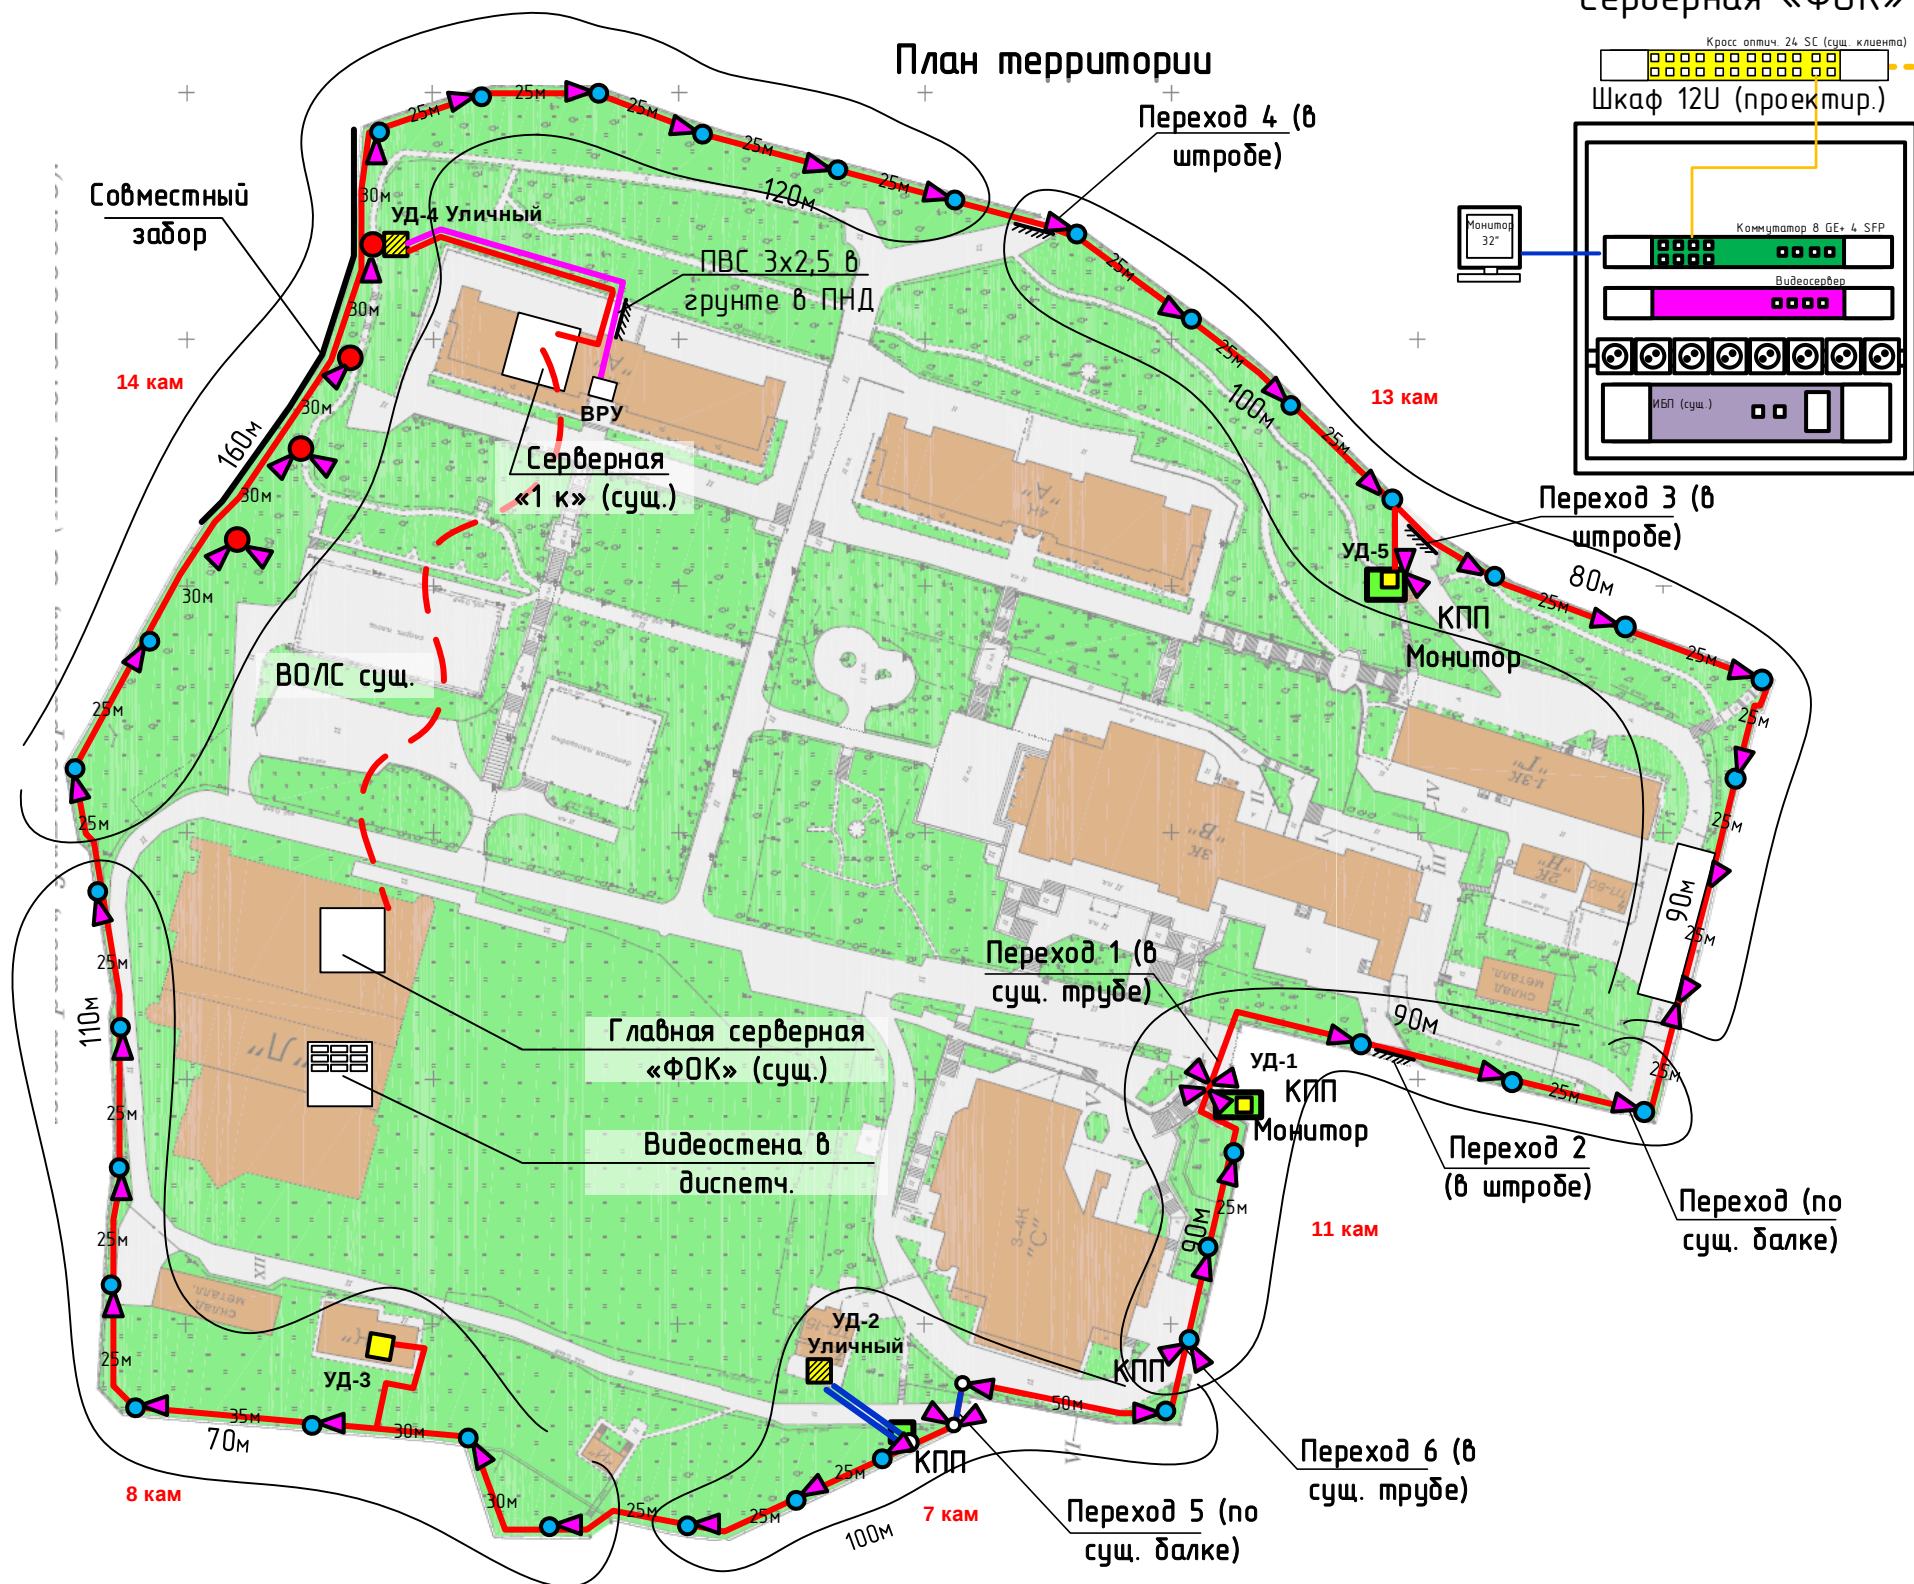

Условные обозначения

-  Кабель ВОЛС 8 ОВ (по забору и в грунт в ПНД-трубе)
-  Кабель ВОЛС 8 ОВ (подвес)
-  Кабель UTP cat.5e
-  Проектируемая трубостойка к забору L=3м
-  Проектируемая опора мет. 100x100 H=4.5 м
-  Существующая опора освещения

-  Улич. цилиндр. в/к
-  Узел доступа (улич.)
-  Узел доступа (внутр.)
-  КПП

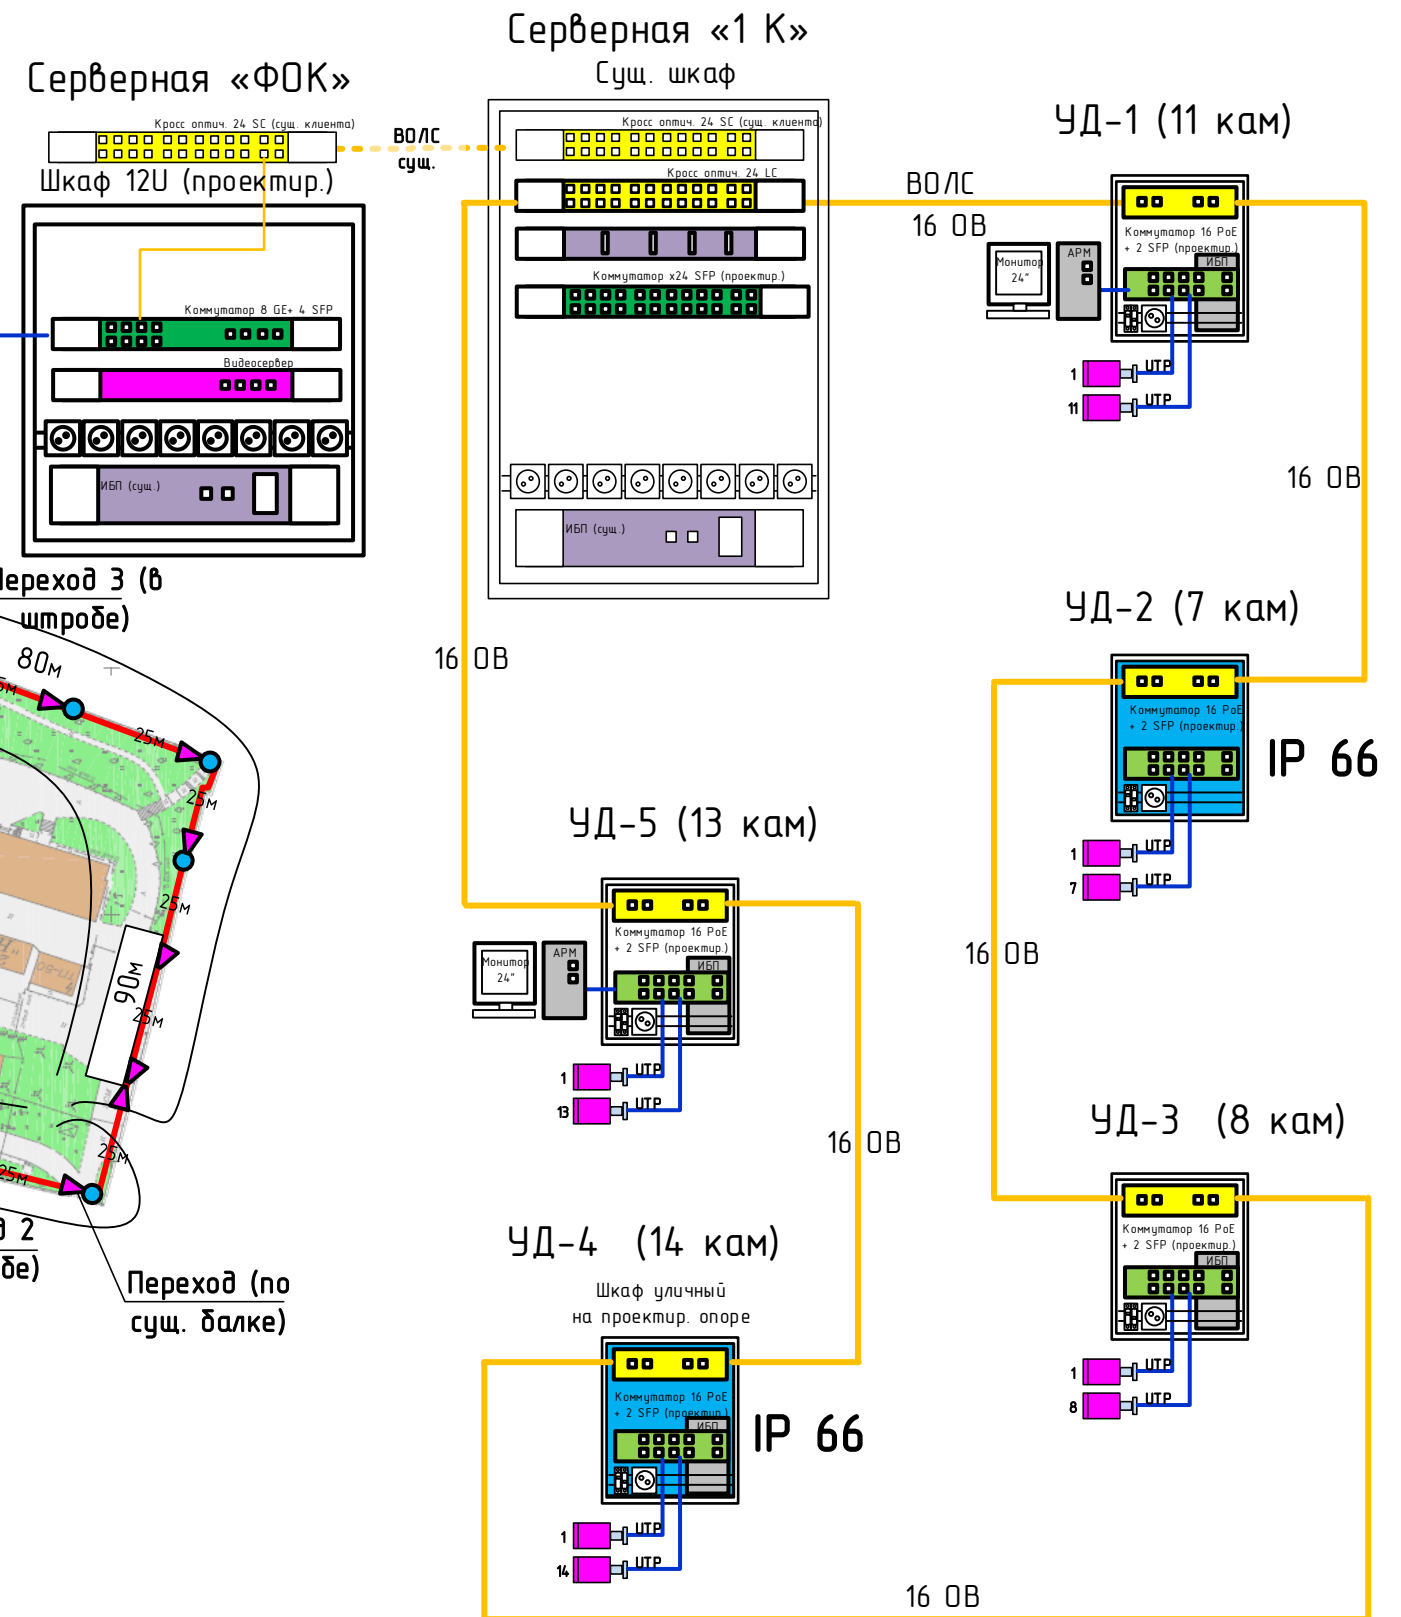

						Система охранного видеонаблюдения. Клиент: ФБЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» – ППИ				
						Организация системы охранного видеонаблюдения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Заказчик: ПАО «МТС»		Страница	Лист	Листов
ГИП		Климов			10.25			ППИ	3	8
						Схема организации связи системы охранного видеонаблюдения				
Разраб.		Рогожников			10.25					
Н. контр.		Климов			10.25					

Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ (проектируемые материалы):

Усл. обозн.	Наименование	Кол-во	Поставщик
	Шкаф настенный 6U, дверь металл	3	ПО
Согласовать тип с кл.	Стойка 42U, (открытая или закрытая)	1	ПО
	Шкаф климатический 6U, (улич. IP66)	2	ПО
	Блок розеток 19"	1	ПО
	Кабельный органайзер	6	ПО
	Розетка на din-рейку	10	ПО
	Автоматический выключатель C6 2P	10	ПО
	Трудостойка мет. 80x80 h=2,5м, RAL	32	ПО
	Опора мет. отдельност. 100x100 h=4м, RAL	4	ПО
	Кабель UTP cat.5e outdoor	6500	ПО
	Труба ПНД гладкая d40	2000	ПО
	Муфта разветвительная на ПНД-трубу	30	ПО
	Труба ПВХ гофрир. d32 черная	1000	ПО
	Кабель ВВГнг 3x2,5	220	ПО
	Кабель ВОЛС КОС-ОКД-16-4кН	2000	ПО
	Кросс оптический КРС-4	5	ПО
	Кросс оптический КРС-24	1	ПО
	Патч-корд оптический	24	ПО

СПЕЦИФИКАЦИЯ (проектируемое оборудование)
минимальные требования

Примечание	Наименование	Кол-во	Поставщик
	IP-видеокамера уличная 3,6мм (периметр)	41	МТС
	IP-видеокамера уличная 3,6мм (террит.)	12	МТС
Серв.ФОК	Коммутатор x24 SFP	1	МТС
УД 1-5	Коммутатор x16 Extended PoE + 2 SFP	5	МТС
Серв.ФОК	SFP-модуль (медный) 10/100/1000	5	МТС
Серв. ФОК	Видеосервер на проект. IP в/камеры в кол-ве 105 шт.	1	МТС
Серв. ФОК	HDD 16Tb (глубина архива 1 мес 15к/с)	3	МТС
УД 1-5	ИБП 0,6 кВА	5	МТС
Серв. ФОК	ИБП 1 кВА rack mount 19"	1	МТС
С учетом резервир.	SFP-модуль (пара) 1xLC (single) 3км 1GE	11	МТС
Серверная А	АРМ (монитор 32" (диагональ выбрана экспертно))	1	МТС
КПП УД1, УД5	АРМ (Устройство вывода изображения + монитор 24" (диагональ выбрана экспертно))	2	МТС
Диспетчерская ФОК	ВИДЕОСТЕНА	1	МТС
	Коробка монтажная под в/камеру	53	МТС

Работы:

Монтаж видеокамеры	53 шт	Штроба в бет. + восстановл.	60 м.п.
Монтаж оборудования	28 ед	Монтаж гофротруды d32	1000 м
Монтаж шкафа 6-9U	3 шт	Монтаж автомата	10 шт
Монтаж стойки 42U	1 шт	Монтаж розетки на Din-рейку	10 шт
Монтаж шкафа уличного	2 шт	Монтаж кросса 4 ОВ	5 шт
Монтаж органайзера 1U	6 шт	Монтаж кросса 24 ОВ	1 шт
Монтаж трудостойки 2,5м	32 шт	Сварка ОВ в кроссе	96 шт
Монтаж опоры 4,5м	4 шт	Монтаж опт. патч-кордов	24 шт
Монтаж ВОК-16 в ПНД (гр.+забор)	2000 м	Монтаж блока розеток 19"	1 шт
Монтаж UTP 5e на улице	6500 м	Монтаж видеостены	1 шт
Монтаж ВВГ 3x2,5	220 м		

						Система охранного видеонаблюдения. Клиент: ФБ/ЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» – ППИ			
						Организация системы охранного видеонаблюдения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик: ПАО «МТС»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Климов			10.25		ППИ	4	8
Разраб.		Рогожников			10.25		Спецификация Верхняя зона		
Н. контр.		Климов			10.25				



**Схема организации связи системы охранного видеонаблюдения для клиента
ФБЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС»к г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53
НИЖНЯЯ ТЕРРИТОРИЯ**



Примечание:

Связь между верхней и нижней зоной предоставляет заказчик по сущ. ВОЛС двумя возможными способами:


Вариант 1: между серверной ФОК и лодочной станцией

Вариант 2: между серверной ФОК и Зданием 2К

Требуемая емкость кабеля – 1 ОВ.


Вариант 1

ВОЛС (суш.)
в основную
серверную
ФОК (верх.
зона)

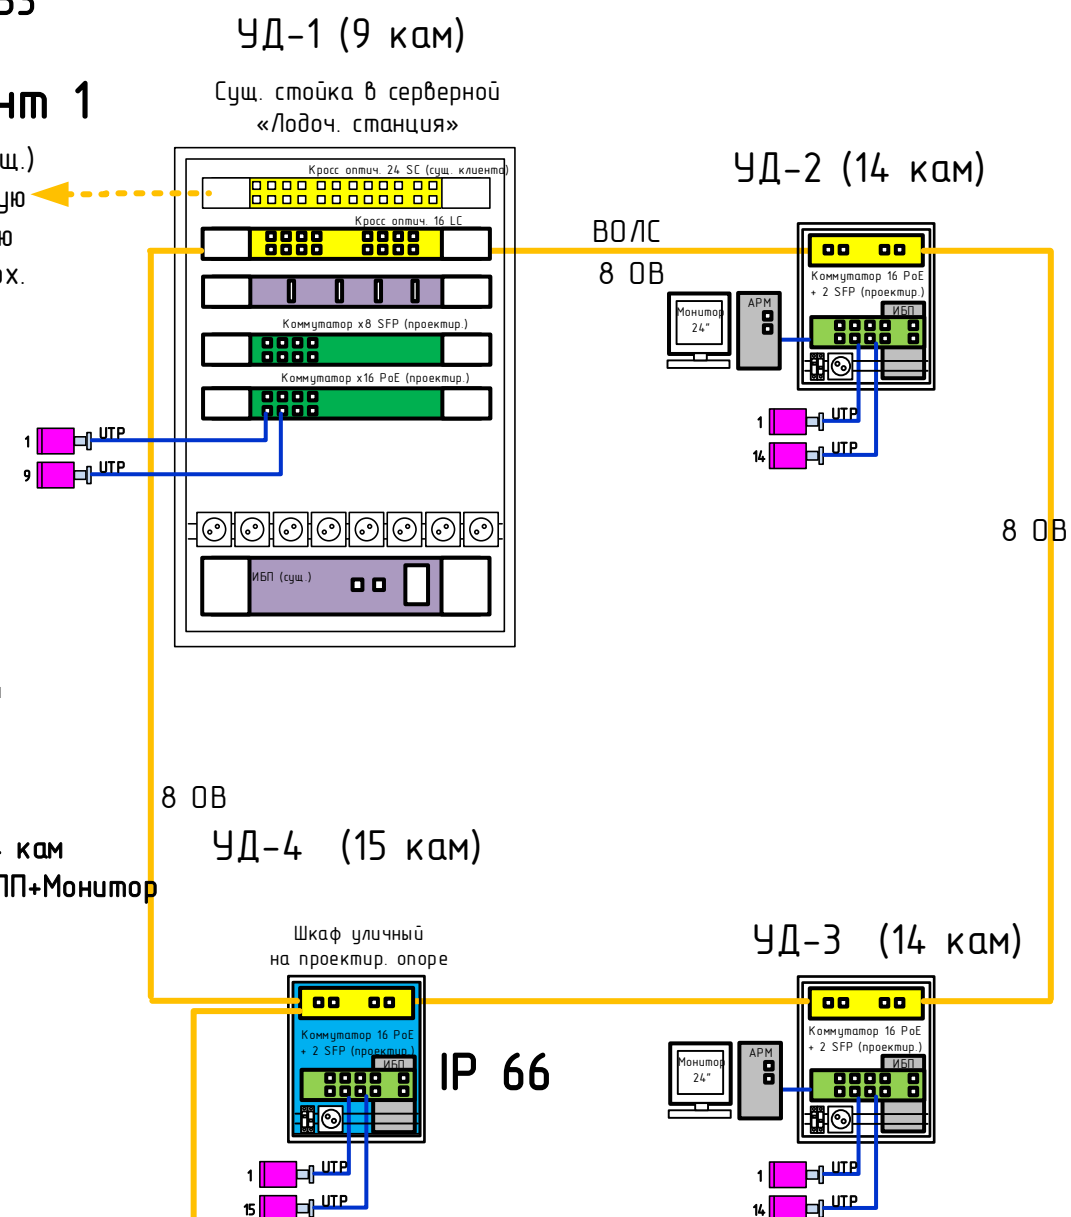

Вариант 2

ВОЛС (сущ.)
в основную
серверную
ФОК (верх.
зона)

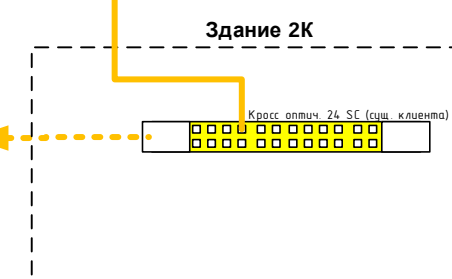

Условные обозначения

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------|
|  | Кабель ВОЛС 8 ОВ (по забору и в грунт в ПНД-трубе) |  | Улич. цилинд. в/к |
|  | Кабель ВОЛС 8 ОВ (подвес) |  | Узел доступа (улич.) |
|  | Кабель UTP cat.5e |  | Узел доступа (внутр.) |
|  | Проектируемая трубостойка к забору L=3м |  | КПП |
|  | Проектируемая опора мет. 100x100 H=4.5 м |  | Проектируемая опора H=8 м |
|  | Существующая опора освещения | | |

						Система охранного видеонаблюдения. Клиент: ФБ/ЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» – ППИ				
						Организация системы охранного видеонаблюдения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Заказчик: ПАО «МТС»		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Климов			10.25			ППИ	5	8
Разраб.		Рогожников			10.25	Схема организации связи системы охранного видеонаблюдения				
Н. контр.		Климов			10.25					

Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ (проектируемые материалы):

Усл. обозн.	Наименование	Кол-во	Поставщик
	Шкаф настенный 6U, дверь металл	2	ПО
	Шкаф климатический, (улич. IP66)	1	ПО
	Кабельный органайзер	4	ПО
	Розетка на din-рейку	8	ПО
	Автоматический выключатель C6 2P	8	ПО
	Трубостойка мет. 80x80 L=2,5м, RAL	10	ПО
	Опора мет. отдельност. 100x100 h=4м, RAL	14	ПО
	Кабель UTP cat.5e outdoor	6400	ПО
	Труба ПНД гладкая d40	2000	ПО
	Муфта разветвительная на ПНД-трубу	25	ПО
	Труба ПВХ гофрир. d32 черная	1000	ПО
	Кабель ВВГнг 3x2,5	150	ПО
	Кабель ВОЛС КОС-ОКД-8-4кН	2000	ПО
	Кросс оптический КРС-4	4	ПО
	Кросс оптический КРС-16	1	ПО
	Патч-корд оптический	20	ПО

Работы:

Монтаж видеокамеры	51 шт	Монтаж гофротрубы d32	1000 м
Монтаж оборудования	12 ед	Монтаж автомата	8 шт
Монтаж шкафа 6-9U	2 шт	Монтаж розетки на Din-рейку	8 шт
Монтаж шкафа уличного	1 шт	Монтаж кросса 4 ОВ	4 шт
Монтаж органайзера 1U	4 шт	Монтаж кросса 16 ОВ	1 шт
Монтаж трубостойки 2,5м	10 шт	Сварка ОВ в кроссе	40 шт
Монтаж опоры 4,5м	14 шт	Монтаж опт. патч-кордов	20 шт
Монтаж ВОК-8 в ПНД (грунт+забор)	2000 м		
Монтаж UTP 5e на улице	5300 м		
Монтаж ВВГ 3x2,5 (в ПНД в грунте)	150 м		
Штроба в бет. + восстановл.	30 м.п.		

СПЕЦИФИКАЦИЯ (проектируемое оборудование)
минимальные требования

Усл. обозн.	Наименование	Кол-во	Поставщик
	IP-видеокамера уличная 3,6мм (периметр)	38	МТС
	IP-видеокамера уличная 3,6мм (террит.)	14	МТС
УД-1	Коммутатор x8 SFP	1	МТС
УД 1-4	Коммутатор x16 Extended PoE + 2 SFP	4	МТС
УД 2-4	ИБП 0,6 кВА	3	МТС
УД-1	ИБП 1 кВА rack mount 19"	1	МТС
	SFP-модуль (пара) 1xLC (single) 3км 1GE	7	МТС
	Коробка монтажная под в/камеру	52	МТС
КПП УД2, 3	АРМ (Устройство вывода изображения + монитор 24" (диагональ выбрана экспертно))	2	МТС

						Система охранного видеонаблюдения. Клиент: ФБ/ЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» – ППИ			
						Организация системы охранного видеонаблюдения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик: ПАО «МТС»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Климов			10.25		ППИ	6	8
Разраб.		Рогожников			10.25		Спецификация Нижняя зона		
Н. контр.		Климов			10.25				



Спецификация сводная

СПЕЦИФИКАЦИЯ (проектируемые материалы):

Усл. обозн.	Наименование	Кол-во	Поставщик
	Шкаф настенный 6U, дверь металл	8	ПО
Согласовать тип с кл.	Стойка 42U, (открытая или закрытая)	1	ПО
	Шкаф климатический 6U, (улич. IP66)	3	ПО
	Блок розеток 19"	1	ПО
	Кабельный органайзер	10	ПО
	Розетка на din-рейку	18	ПО
	Автоматический выключатель C6 2P	18	ПО
	Трубостойка мет. 80x80 h=2,5м, RAL	42	ПО
	Опора мет. отдельност. 100x100 h=4м, RAL	28	ПО
	Кабель UTP cat.5e outdoor	12900	ПО
	Труба ПНД гладкая d40	4000	ПО
	Муфта разветвительная на ПНД-трубу	55	ПО
	Труба ПВХ гофрир. d32 черная	2000	ПО
	Кабель ВВГнг 3x2,5	370	ПО
	Кабель ВОЛС КОС-ОКД-16-4кН	2000	ПО
	Кабель ВОЛС КОС-ОКД-8-4кН	2000	ПО
	Кросс оптический КРС-4	9	ПО
	Кросс оптический КРС-16	1	ПО
	Кросс оптический КРС-24	1	ПО
	Патч-корд оптический	44	ПО

СПЕЦИФИКАЦИЯ (проектируемое оборудование)
минимальные требования

Примечание	Наименование	Кол-во	Поставщик
	IP-видеокамера уличная 3,6мм (периметр)	79	МТС
	IP-видеокамера уличная 3,6мм (террит.)	26	МТС
Серв.ФОК	Коммутатор x24 SFP	1	МТС
УД-1	Коммутатор x8 SFP	1	МТС
УД 1-5	Коммутатор x16 Extended PoE + 2 SFP	9	МТС
Серв.ФОК	SFP-модуль (медный) 10/100/1000	5	МТС
Серв. ФОК	Видеосервер на проект. IP в/камеры в кол-ве 105 шт.	1	МТС
Серв. ФОК	HDD 16Tb (глубина архива 1 мес 15к/с)	3	МТС
УД 1-5	ИБП 0,6 кВА	8	МТС
Серв. ФОК	ИБП 1 кВА rack mount 19"	2	МТС
С учетом резервир.	SFP-модуль (пара) 1xLC (single) 3км 1GE	18	МТС
Серверная А	АРМ (монитор 32" (диагональ выбрана экспертно))	1	МТС
КПП УД1, УД5	АРМ (Устройство вывода изображения + монитор 24" (диагональ выбрана экспертно))	4	МТС
Диспетчерская ФОК	ВИДЕОСТЕНА	1	МТС
	Коробка монтажная под в/камеру	105	МТС

Работы:

Монтаж видеокамеры	105 шт	Монтаж гофротрубы d32	2000 м
Монтаж оборудования	28 ед	Монтаж автомата	18 шт
Монтаж шкафа 6-9U	8 шт	Монтаж розетки на Din-рейку	18 шт
Монтаж шкафа уличного	3 шт	Монтаж кросса 4 ОВ	9 шт
Монтаж органайзера 1U	10 шт	Монтаж кросса 16 ОВ	1 шт
Монтаж трубостойки 2,5м	42 шт	Монтаж кросса 24 ОВ	1 шт
Монтаж опоры 4,5м	28 шт	Сварка ОВ в кроссе	136 шт
Монтаж ВОК в ПНД (грунт+забор)	4000 м	Монтаж опт. патч-кордов	44 шт
Монтаж UTP 5e на улице	12900 м		
Монтаж ВВГ 3x2,5 (в ПНД в грунте)	370 м		
Штроба в бет. + восстановл.	90 м.п.		

						Система охранного видеонаблюдения. Клиент: ФБ/ЛПУ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» – ППИ					
						Организация системы охранного видеонаблюдения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик: ПАО «МТС»			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Климов			10.25				ППИ	7	8
Разраб.		Рогожников			10.25	Спецификация Сводная					
Н. контр.		Климов			10.25						

Фотоматериалы

Проложенные по ограждению суш. коммуникации



Внешний вид периметра



Суш. серверный шкаф клиента



Будка КПП



						Система охранного видеонаблюдения. Клиент: ФБ/ПЧ «САНАТОРИЙ РАДУГА ФНС» – ППИ			
						Организация системы охранного видеонаблюдения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик: ПАО «МТС»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Климов			10.25		ППИ	8	8
Разраб.		Рогожников			10.25	Фотоматериалы			
Н. контр.		Климов			10.25				
